Proceso Scrum -Review

CivicTrackIO

Autores:
Luna Alexandra Beltrán Escobar
Sarah Esther Calderón Legarda
Leidy Fernanda Eraso Vásquez

DOCUMENTO	
Título:	Review-CivicTrackIO
Fecha de elaboración:	28/04/2026
Versión:	1

REGISTRO DE CAMBIOS			
Versión	*Páginas*	*Fecha de modificación*	*Motivo del cambio*

1. Información general del Sprint

Integrantes Equipo:	Luna Alexandra Beltrán Escobar, Sarah Esther Calderón Legarda y Leidy Fernanda Eraso Vásquez
Sprint No:	2
Fecha inicio:	2 de abril
Fecha fin:	15 de abril
Objetivo del Sprint	Implementar el módulo de mapa interactivo en la aplicación, permitiendo la visualización en tiempo real de reportes de hurto, la aplicación de filtros por fecha, horario y zona, y la configuración de alertas por cercanía, con el fin de apoyar al usuario en la identificación de zonas de riesgo y la toma de decisiones seguras.

2. Problema que aborda el producto

En Colombia, el hurto representa una amenaza creciente a la seguridad ciudadana, con al menos, 1.794.728 casos registrados entre 2018 y 2023 —según reportes de la Policía Nacional y el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional (MinDefensa, 2025)— y un aumento anual promedio del 22%.


En Pasto, séptima ciudad en victimización nacional (Criollo, 2024), los hurtos subieron un 18,8% anual en promedio en ese periodo —datos del Observatorio del Delito (Urbina Bravo, 2025)—, impulsados por causas como el desempleo (13,5%) y pobreza (45,7%), esto según un informe dispuesto por DNP del 2021.

La percepción del 82% de la población lo asocia también a la ineficacia policial (Fundación Seguridad y Democracia, 2006), lo que genera daños físicos/psicológicos, desconfianza y desinformación sobre prevención y denuncia, pese a apps digitales existentes pero poco utilizadas.


3. Incremento funcional (Demostración)

Funcionalidades desarrolladas:


HU7:	**Como usuario quiero recibir alertas cuando se reporte un hurto cercano a mi ubicación actual para tomar medidas de autocuidado.**

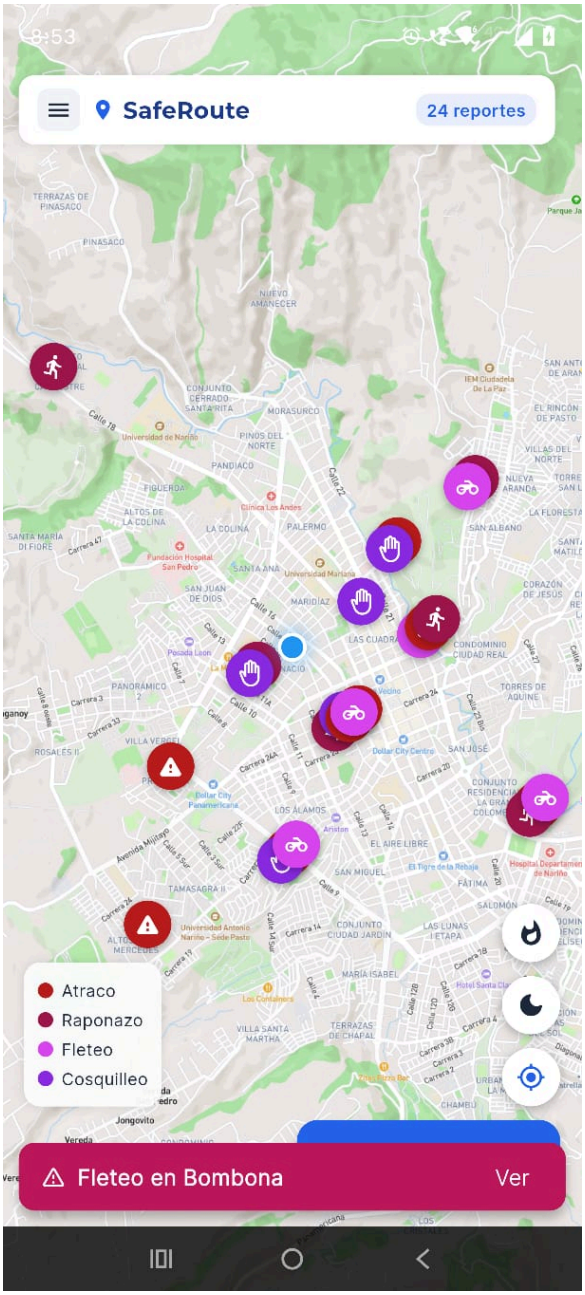


HU8:	**Como usuario quiero visualizar en un mapa interactivo con los puntos donde se han reportado hurtos para identificar zonas de alto riesgo en tiempo real (actualización automática del mapa en un intervalo máximo de 1 minuto después del registro de un nuevo incidente).**

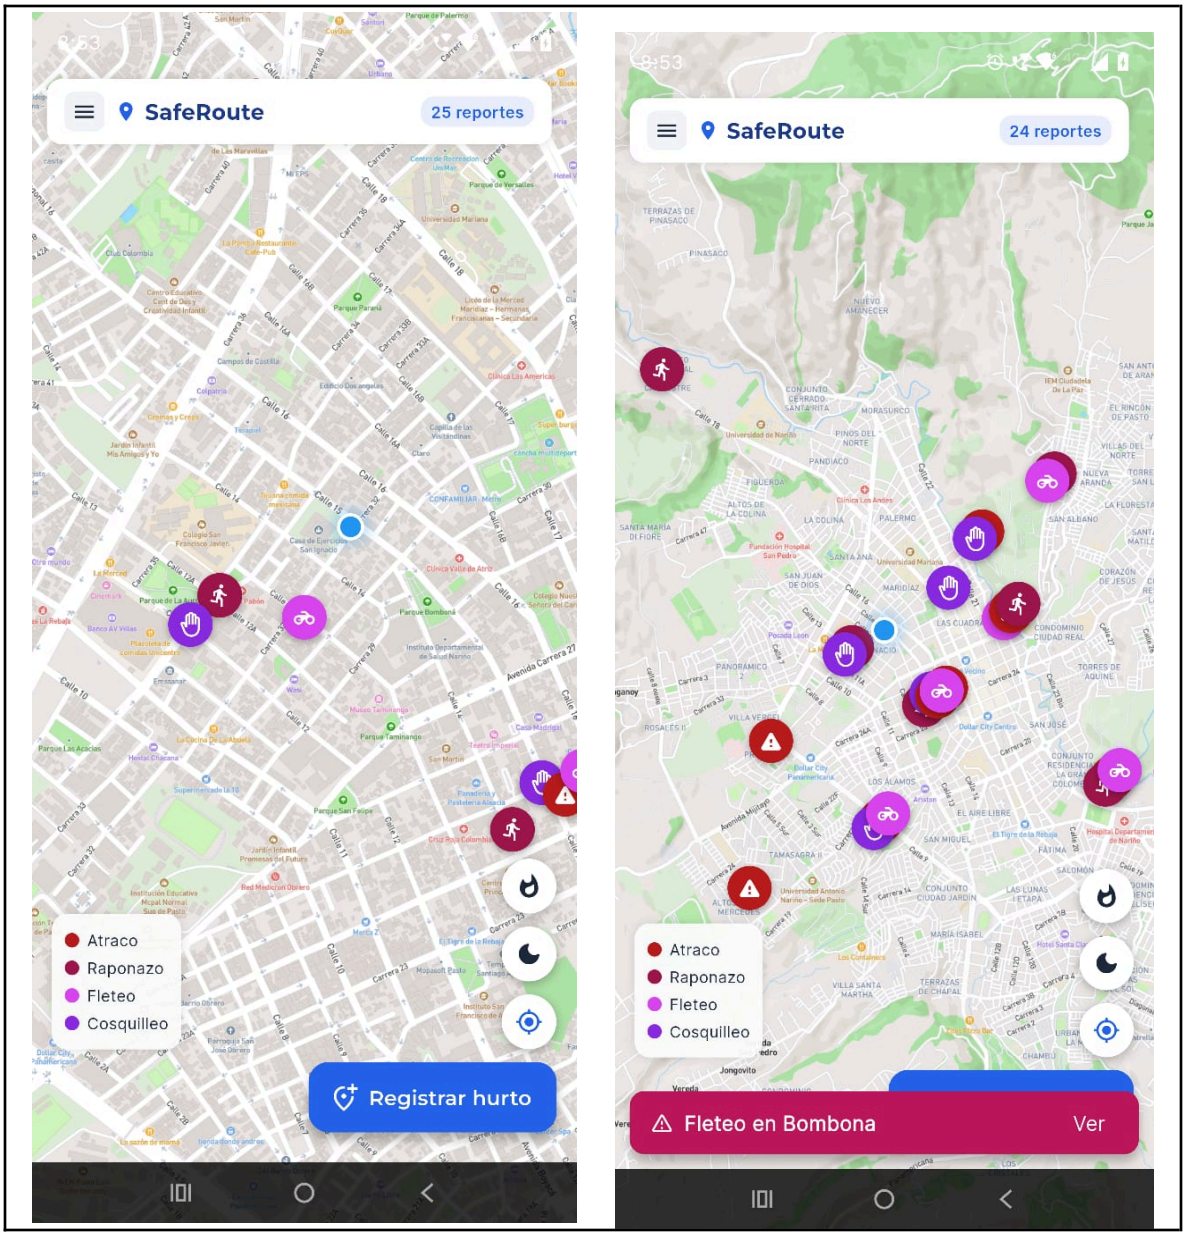


HU9:	**Como usuario quiero poder filtrar los hurtos por fecha, horario y zona para hacer comparaciones simples entre diferentes momentos y lugares y poder restablecer los filtros cuando no los necesite.**
Filtro por: Rango de Fechas	

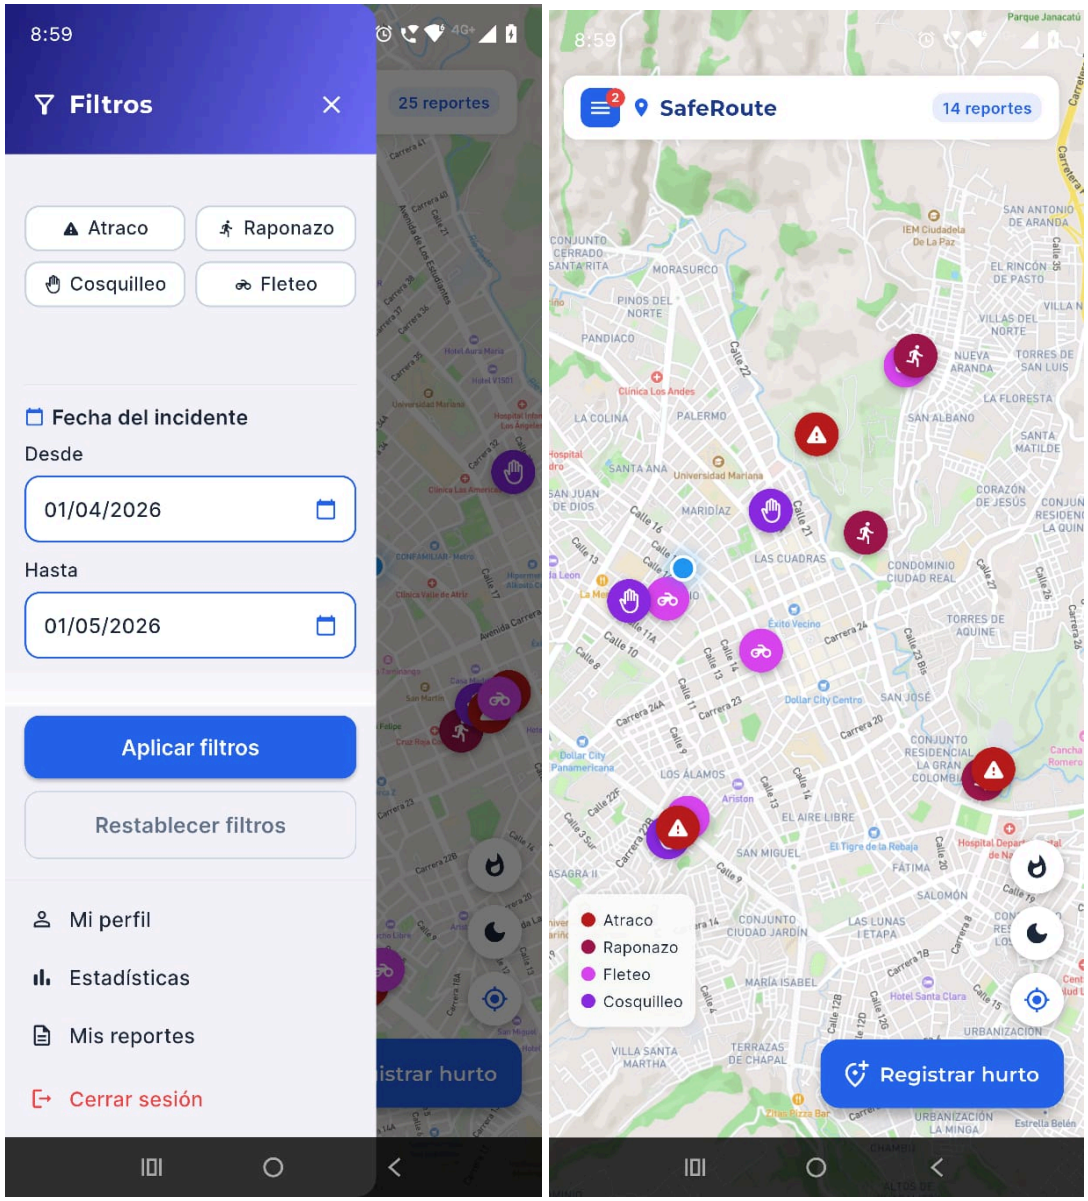


Filtro por: horario

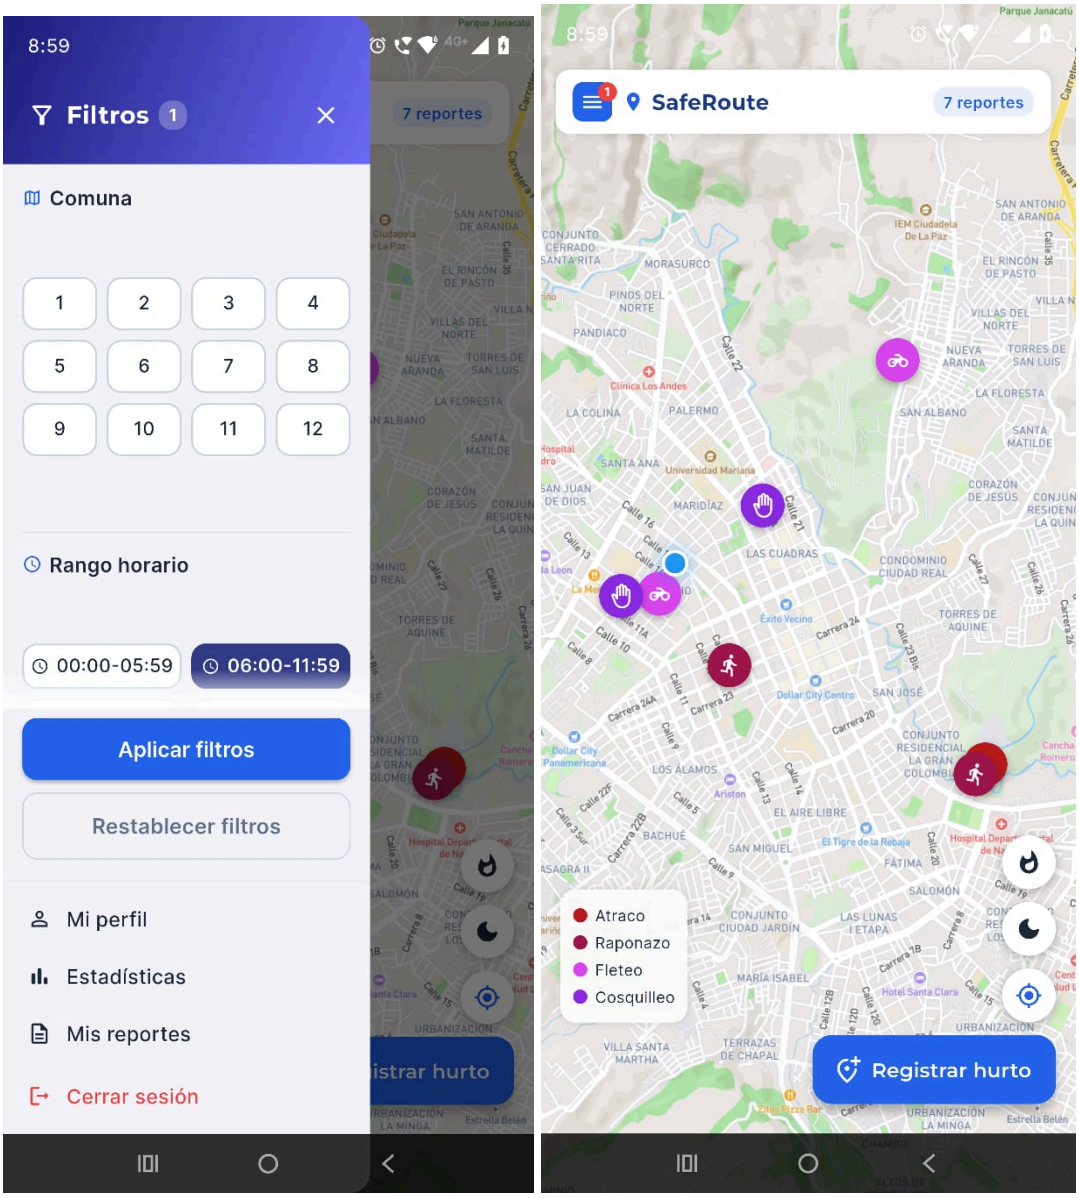

Filtro por: Zona (Comuna 6)

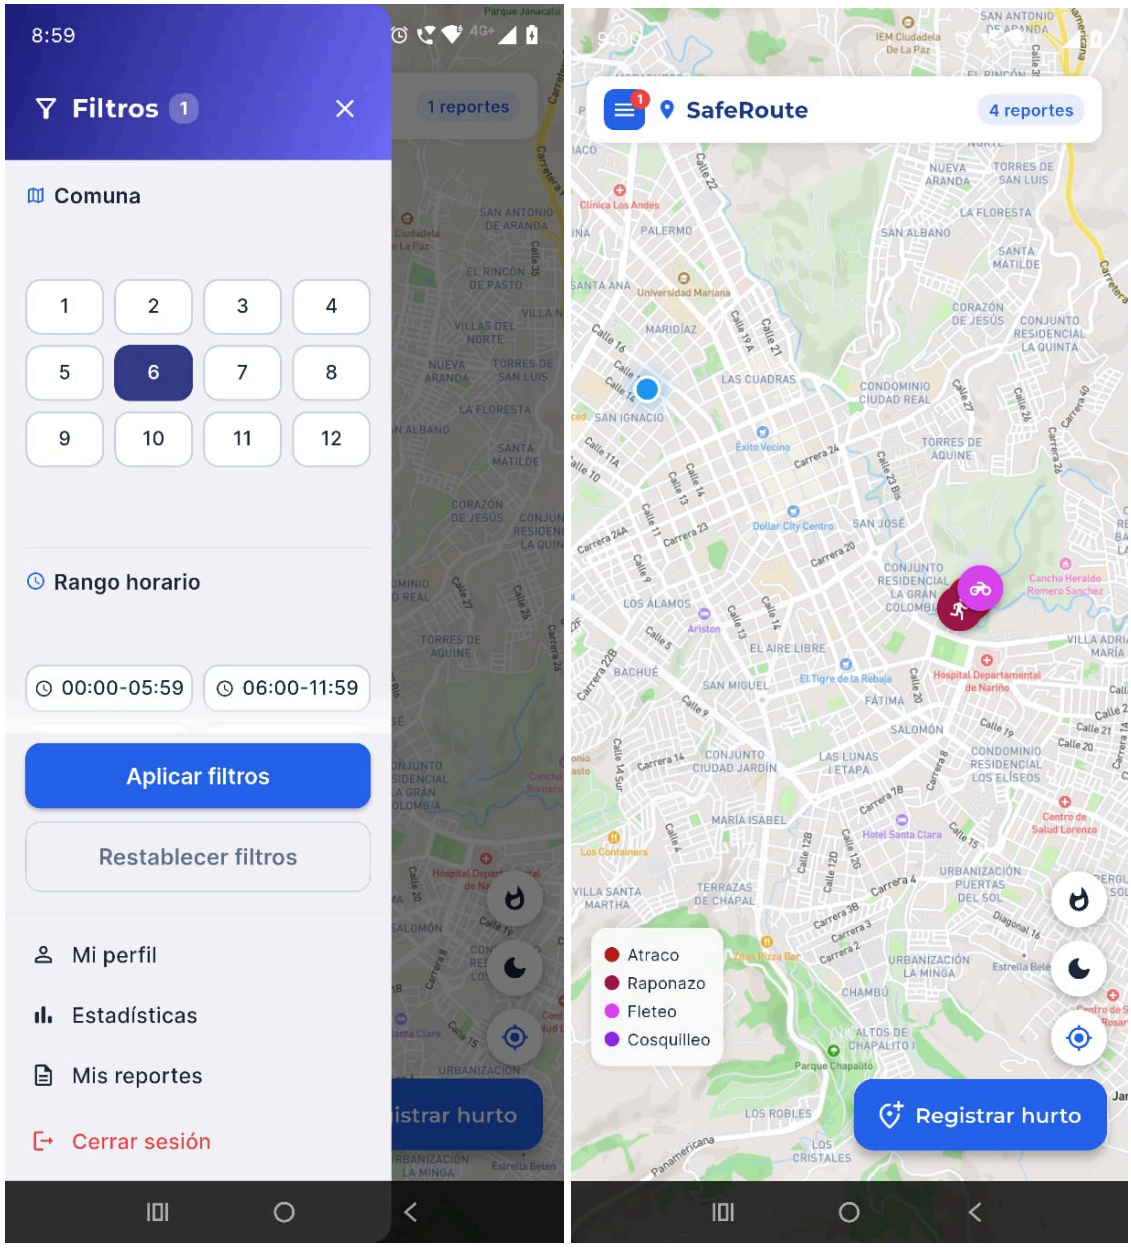

Restablecimiento de Filtros

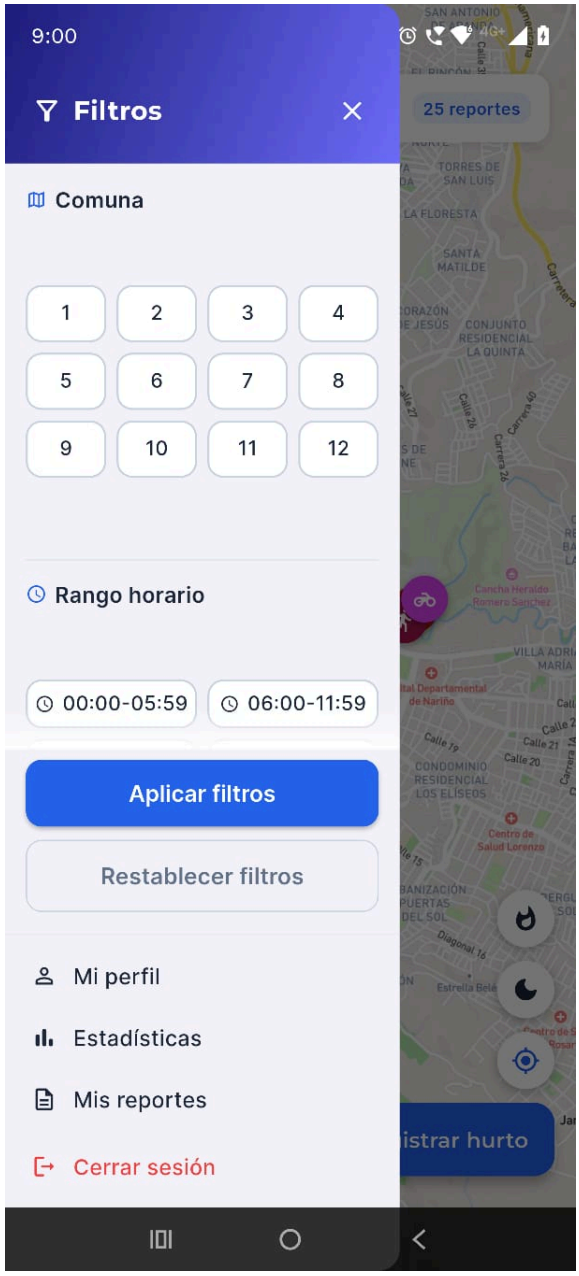

3. Valor entregado al usuario

*Con base en las historias de usuario completadas en el Sprint 2, el Índice de Valor Entregado (IVE) es **1**, ya que la entrega está alineada al valor esperado.*

4. Métricas de productividad

En la Tabla 1, se puede observar los resultados e interpretación de las métricas que están asociadas con la productividad.

Tabla 1. Métricas de productividad

Métrica	Resultado	Interpretación
Velocity (%)	100%	**Buen nivel de compromiso realista**
Índice de Valor Entregado (IVE)	1	**Entrega alineada al valor esperado**

5. Feedback de stakeholders

A continuación, se presenta la retroalimentación realizada por los stakeholders

Comentarios recibidos
El avance es significativo y se evidencia un buen avance

Sugerencias de mejora
- Fortalecer las validaciones asociadas al módulo de alertas, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas por parte del usuario y garantizar que las notificaciones emitidas sean coherentes y relevantes. - Implementar un mecanismo de validación para identificar y unificar posibles registros duplicados de un mismo incidente de hurto (por ejemplo, cuando víctimas y testigos reportan el mismo hecho), con el propósito de mejorar la calidad e integridad de la información almacenada. - Incorporar mensajes informativos y de orientación en el uso de los filtros por fecha, indicando rangos válidos y alertando al usuario cuando la búsqueda no arroje resultados o cuando el rango seleccionado sea incorrecto.

7. Aprendizajes del Sprint

A continuación, se presenta los aprendizajes adquiridos por los integrantes del equipo

¿Qué aprendió el equipo?
Durante el Sprint 2, el equipo fortaleció sus conocimientos en el uso de nuevas tecnologías relacionadas con la integración de mapas mediante SDK, el manejo de permisos de ubicación y la implementación de notificaciones para alertas cercanas y se adquirió experiencia en el desarrollo de funcionalidades de filtrado y paginación para mejorar la consulta de reportes, junto con la creación de vistas e índices en la base de datos para optimizar el rendimiento del sistema.

8. Acciones para el siguiente Sprint

En esta sección se presentan las modificaciones que se realizan al *Product Backlog* con base en el *review* y las nuevas funcionalidades incorporadas**.**

Cambios en el Product Backlog

- Se incluyó el fortalecimiento de validaciones en el módulo de alertas, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas y mejorar la precisión de las notificaciones enviadas al usuario.
- Se agregó como mejora la implementación de validaciones para identificar posibles reportes duplicados de un mismo incidente (por ejemplo, cuando víctima y testigo registran el mismo hecho), con el propósito de mejorar la calidad de los datos y reducir inconsistencias.
- Se incorporó la necesidad de añadir mensajes informativos en el módulo de filtros por fecha, para orientar al usuario sobre rangos válidos y evitar errores en el uso del sistema.
- Se ajustó la planificación del siguiente Sprint con el fin de mejorar la estimación del esfuerzo requerido, aplicando técnicas como Planning Poker o Story Points para reducir desviaciones entre tiempo estimado y real.
- Se definió como acción prioritaria incluir actividades de investigación técnica y transferencia de conocimiento, con el fin de fortalecer el dominio de herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema.
- Se estableció la necesidad de realizar validaciones continuas del valor del producto mediante demostraciones y retroalimentación frecuente, para garantizar que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades reales del usuario final.

Nuevas funcionalidades
Ninguna
